
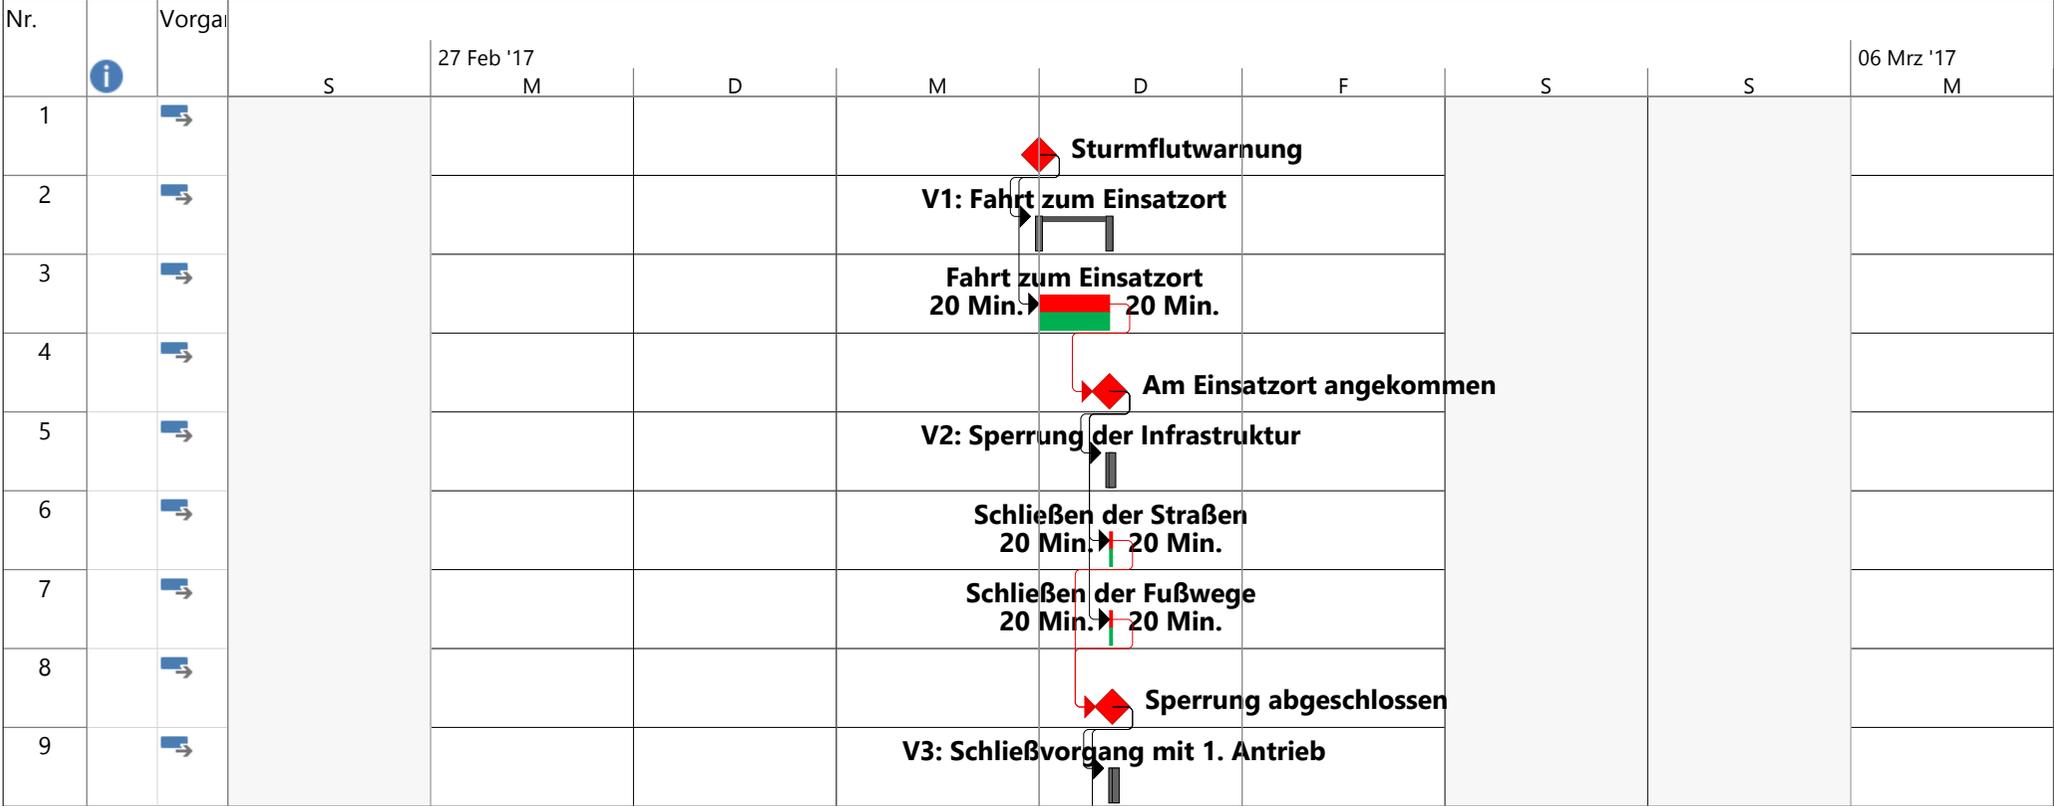


HWS-Tor\_GroßeElbstraße\_Basisplan



Kritisch		Nur Ende		Manueller Sammelvorgang	
Kritische Unterbrechung		Nur Dauer		Projektsammelvorgang	
Kritisch in Arbeit		Geplant		Externe Vorgänge	
Vorgang		Geplante Unterbrechung		Externer Meilenstein	
Unterbrechung		Geplanter Meilenstein		Inaktiver Vorgang	
Vorgang in Arbeit		Meilenstein		Inaktiver Meilenstein	
Manueller Vorgang		Sammelvorgang in Arbeit		Inaktiver Sammelvorgang	
Nur Anfang		Sammelvorgang		Stichtag	

HWS-Tor\_GroßeElbstraße\_Basisplan

Nr.	Vorgang	27 Feb '17							06 Mrz '17	
		S	M	D	M	D	F	S	S	M
10	→					Vorbereitung des Schließens 10 Min. → 10 Min.				
11	→					Schließvorgang 10 Min. → 10 Min.				
12	→					Funkmeldung 5 Min. → 5 Min.				
13	→					◆ Tor geschlossen				
14	→					◆ Tor nicht geschlossen				
15	→					V4: Schließvorgang des Tores mit 2. Antrieb (Automatikantrieb)				
16	→					Schließvorgang 10 Min. → 10 Min.				
17	→					Funkmeldung 5 Min. → 5 Min.				
18	→					◆ Tor geschlossen				

Kritisch		Nur Ende		Manueller Sammelvorgang	
Kritische Unterbrechung		Nur Dauer		Projektsammelvorgang	
Kritisch in Arbeit		Geplant		Externe Vorgänge	
Vorgang		Geplante Unterbrechung		Externer Meilenstein	
Unterbrechung		Geplanter Meilenstein		Inaktiver Vorgang	
Vorgang in Arbeit		Meilenstein		Inaktiver Meilenstein	
Manueller Vorgang		Sammelvorgang in Arbeit		Inaktiver Sammelvorgang	
Nur Anfang		Sammelvorgang		Stichtag	

# HWS-Tor\_GroßeElbstraße\_Basisplan

Nr.	Vorgang	27 Feb '17							06 Mrz '17	
		S	M	D	M	D	F	S	S	M
19	→									
20	→									
21	→									
22	→									
23	→									
24	→									
25	→									
26	→									
27	→									

**Tor nicht geschlossen**

Funkmeldung  
5 Min. → 5 Min.

**V5: Schließvorgang des Tores (manuell)**

Schließvorgang mit KFZ  
25 Min. → 25 Min.

Funkmeldung  
5 Min. → 5 Min.

**Tor geschlossen**

**Tor nicht geschlossen**

Funkmeldung  
5 Min. → 5 Min.

**V6: Aufbau Dammbalken (2. Deichsicherheit)**

Kritisch		Nur Ende		Manueller Sammelvorgang	
Kritische Unterbrechung		Nur Dauer		Projektsammelvorgang	
Kritisch in Arbeit		Geplant		Externe Vorgänge	
Vorgang		Geplante Unterbrechung		Externer Meilenstein	
Unterbrechung		Geplanter Meilenstein		Inaktiver Vorgang	
Vorgang in Arbeit		Meilenstein		Inaktiver Meilenstein	
Manueller Vorgang		Sammelvorgang in Arbeit		Inaktiver Sammelvorgang	
Nur Anfang		Sammelvorgang		Stichtag	

## HWS-Tor\_GroßeElbstraße\_Basisplan

Nr.	Vorgang	27 Feb '17							06 Mrz '17	
		S	M	D	M	D	F	S	S	M
28	→					<b>Vorbereitung der 2. Deichsicherheit 15 Min. ▶ 15 Min.</b>				
29	→					<b>Aufbau der Dammbalken-Elemente 60 Min. ▶ 60 Min.</b>				
30	→					<b>Funkmeldung 5 Min. ▶ 5 Min.</b>				
31	→					<b>Tor geschlossen</b>				
32	→					<b>Tor nicht geschlossen</b>				
33	→					<b>Funkmeldung 5 Min. ▶ 5 Min.</b>				
34	→					<b>V7: Aufbau der Sandsäcke</b>				
35	→					<b>Transport der Sandsäcke vom Lager zum Einsatzort 30 Min. ▶ 30 Min.</b>				
36	→					<b>Aufbau der Sandsäcke 20 Min. ▶ 20 Min.</b>				

Kritisch		Nur Ende		Manueller Sammelvorgang	
Kritische Unterbrechung		Nur Dauer		Projektsammelvorgang	
Kritisch in Arbeit		Geplant		Externe Vorgänge	
Vorgang		Geplante Unterbrechung		Externer Meilenstein	
Unterbrechung		Geplanter Meilenstein		Inaktiver Vorgang	
Vorgang in Arbeit		Meilenstein		Inaktiver Meilenstein	
Manueller Vorgang		Sammelvorgang in Arbeit		Inaktiver Sammelvorgang	
Nur Anfang		Sammelvorgang		Stichtag	

HWS-Tor\_GroßeElbstraße\_Basisplan

Nr.	Vorgang	27 Feb '17							06 Mrz '17	
		S	M	D	M	D	F	S	S	M
37							<b>Funkmeldung 5 Min. ▶ 5 Min.</b>			
38							<b>Tor geschlossen</b>			
39							<b>Tor nicht geschlossen</b>			
40							<b>Gefahr der Überflutung</b>			

Kritisch		Nur Ende		Manueller Sammelvorgang	
Kritische Unterbrechung		Nur Dauer		Projektsammelvorgang	
Kritisch in Arbeit		Geplant		Externe Vorgänge	
Vorgang		Geplante Unterbrechung		Externer Meilenstein	
Unterbrechung		Geplanter Meilenstein		Inaktiver Vorgang	
Vorgang in Arbeit		Meilenstein		Inaktiver Meilenstein	
Manueller Vorgang		Sammelvorgang in Arbeit		Inaktiver Sammelvorgang	
Nur Anfang		Sammelvorgang		Stichtag	
