

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Vorgang	Dauer	Geplante Dauer	Ressourcennamen	
1		Sturmflutwarnung		0 Min.	0 Min.		55 S1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
2		V1: Fahrt zum Einsatzort	1	20 Min.	20 Min.		02.03
3		Fahrt zum Einsatzort	1	20 Min.	20 Min.		
4		Am Einsatzort angekommen	3	0 Min.	0 Min.		02.03
5		V2: Sperrung der Infrastruktur	4	20 Min.	20 Min.		
6		Schließen der Straßen	4	20 Min.	20 Min.		
7		Schließen der Fußwege	4	20 Min.	20 Min.		
8		Sperrung abgeschlossen	7;6	0 Min.	0 Min.		02.03
9		V3: Schließvorgang mit 1. Antrieb	8	25 Min.	25 Min.		
10		Vorbereitung des Schließens	8	10 Min.	10 Min.		
11		Schließvorgang	10	10 Min.	10 Min.		
12		Funkmeldung	11	5 Min.	5 Min.		
13		Tor geschlossen	12	0 Min.	0 Min.		
14		Tor nicht geschlossen	11	0 Min.	0 Min.		
15		V4: Schließvorgang des Tores mit 2. Antrieb (Automatikantrieb)	14	15 Min.	15 Min.		
16		Schließvorgang	14	10 Min.	10 Min.		
17		Funkmeldung	16	5 Min.	5 Min.		

Projekt: HWS-Tor_GroßeElbstra Datum: Fre 16.02.18	Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
	Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
	Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
	Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.		Vorga	Vorgangsname	Vorgä	Dauer	Geplante Dauer	Ressourcennamen	55 S1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45											
18			Tor geschlossen	17	0 Min.	0 Min.													
19			Tor nicht geschlossen	16	0 Min.	0 Min.													
20			Funkmeldung	19	5 Min.	5 Min.													
21			V5: Schließvorgang des Tores (manuell)	19	30 Min.	30 Min.													
22			Schließvorgang mit KFZ	19	25 Min.	25 Min.													
23			Funkmeldung	22	5 Min.	5 Min.													
24			Tor geschlossen	23	0 Min.	0 Min.													
25			Tor nicht geschlossen	22	0 Min.	0 Min.													
26			Funkmeldung	25	5 Min.	5 Min.													
27			V6: Aufbau Dammbalken (2. Deichsicherheit)	22	80 Min.	80 Min.													
28			Vorbereitung der 2. Deichsicherheit	22	15 Min.	15 Min.													
29			Aufbau der Dammbalken-Elemente	28	60 Min.	60 Min.													
30			Funkmeldung	29	5 Min.	5 Min.													
31			Tor geschlossen	30	0 Min.	0 Min.													
32			Tor nicht geschlossen	29	0 Min.	0 Min.													
33			Funkmeldung	32	5 Min.	5 Min.													
34			V7: Aufbau der Sandsäcke	32	55 Min.	55 Min.													

Projekt: HWS-Tor_GroßeElbstra
Datum: Fre 16.02.18

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 2

Nr.		Vorgang	Vorgangsname	Vorgangsnummer	Dauer	Geplante Dauer	Ressourcennamen												
								55	S1	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
35			Transport der Sandsäcke vom Lager zum Einsatzort	32	30 Min.	30 Min.													
36			Aufbau der Sandsäcke	35	20 Min.	20 Min.													
37			Funkmeldung	36	5 Min.	5 Min.													
38			Tor geschlossen	37	0 Min.	0 Min.													
39			Tor nicht geschlossen	36	0 Min.	0 Min.													
40			Gefahr der Überflutung	39	0 Min.	0 Min.													

Projekt: HWS-Tor_GroßeElbstra
Datum: Fre 16.02.18

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein















Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende















Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt













2.03

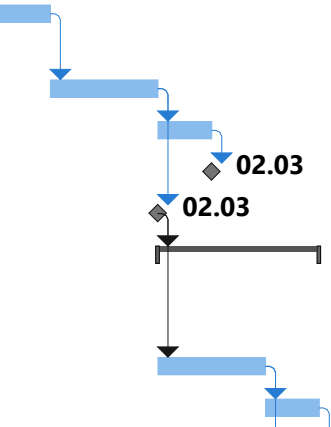


Projekt: HWS-Tor_GroßeElbstra
Datum: Fre 16.02.18

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

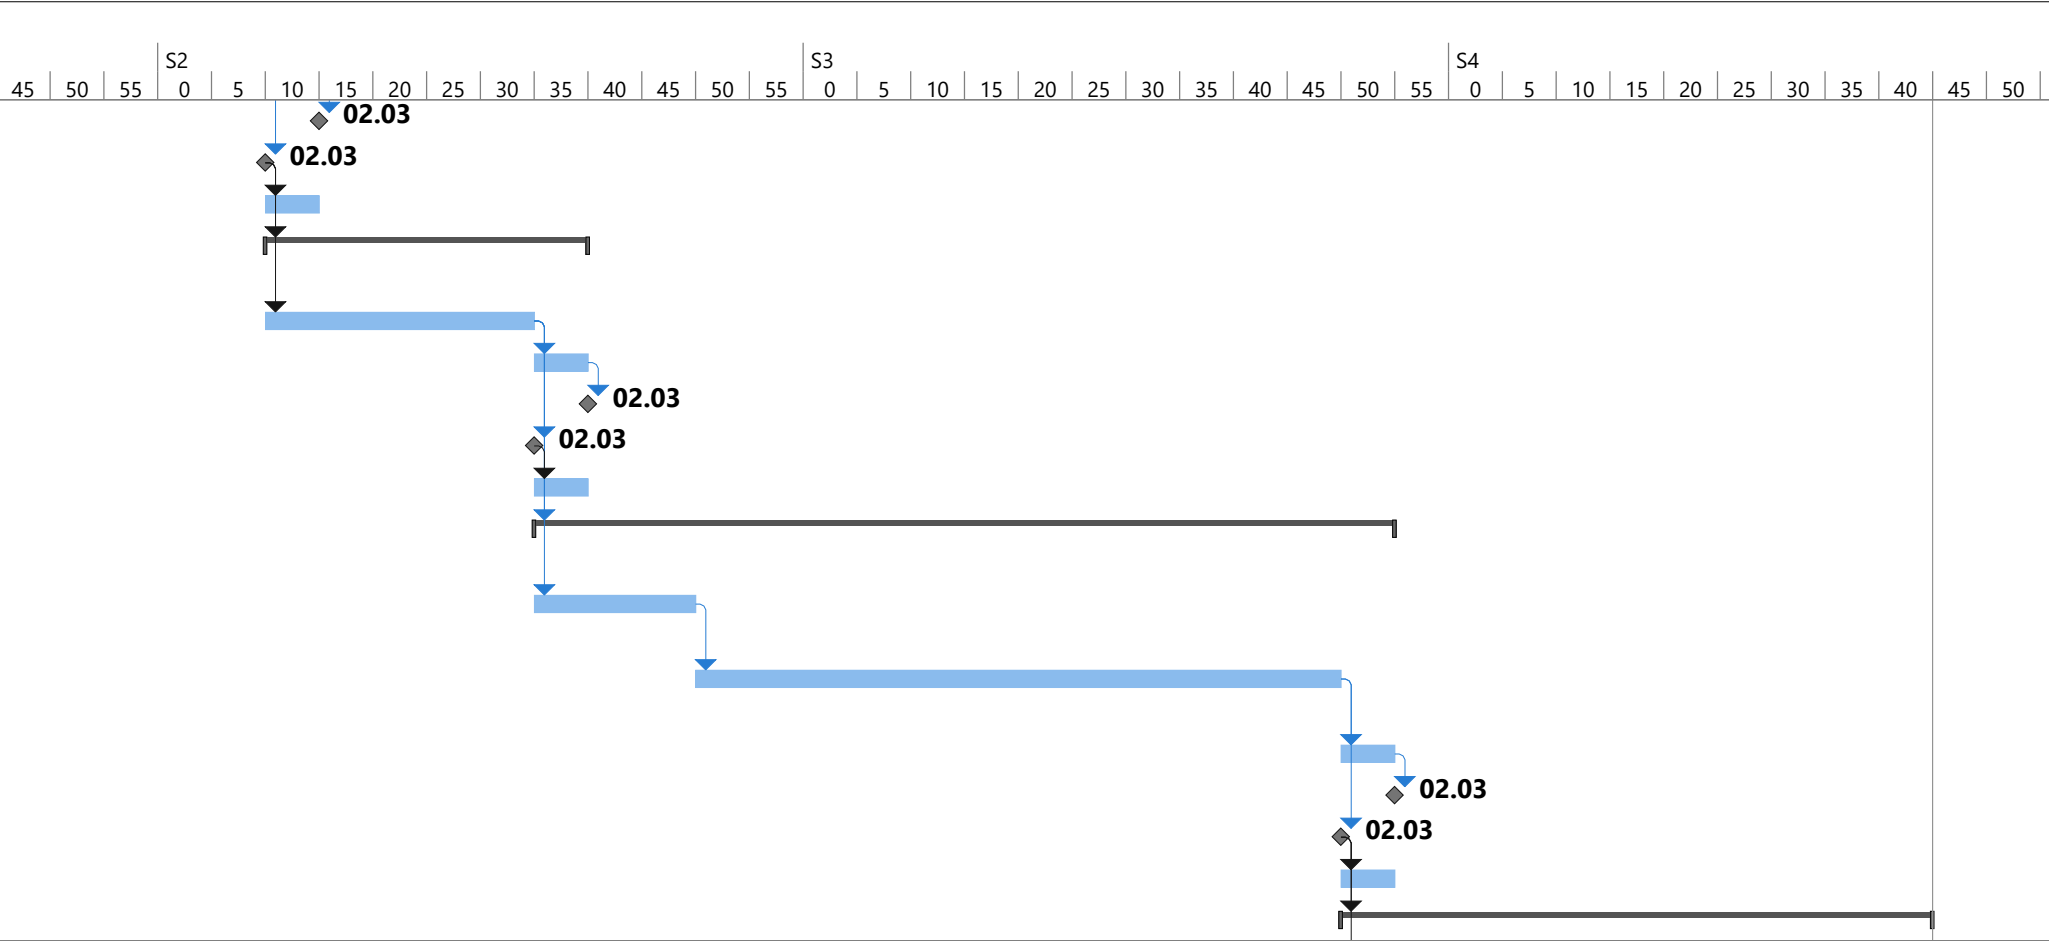

Projekt: HWS-Tor_GroßeElbstra
Datum: Fre 16.02.18

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

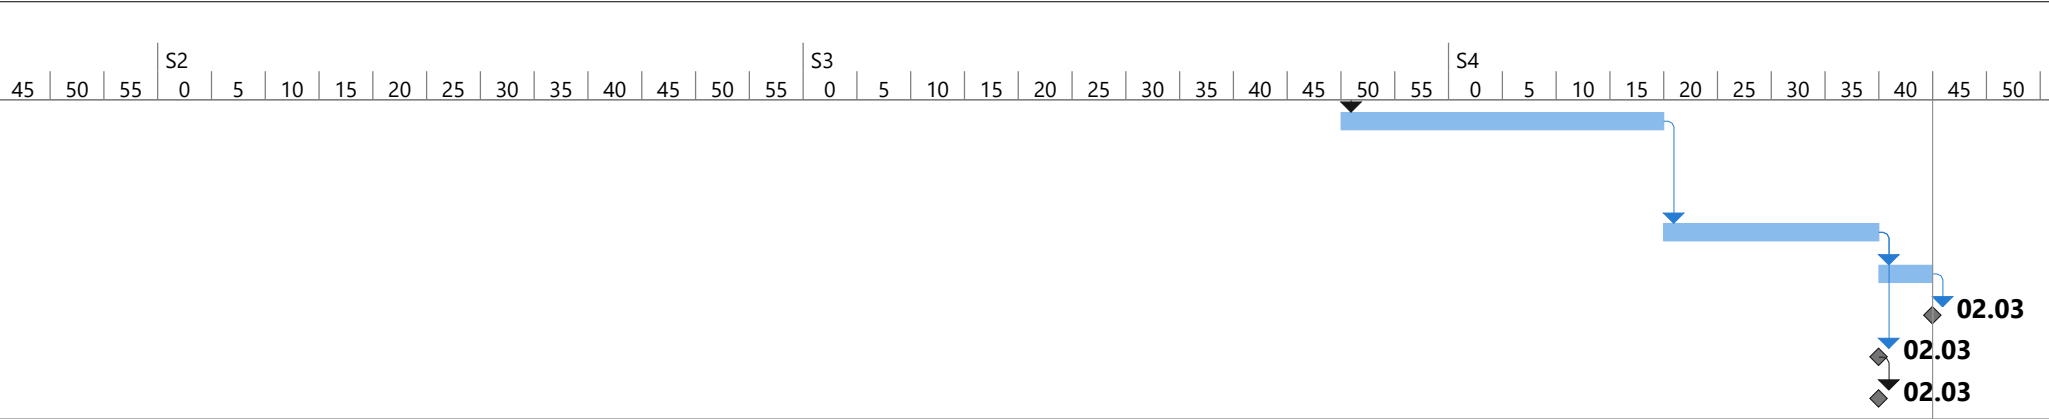

Projekt: HWS-Tor_GroßeElbstra
Datum: Fre 16.02.18

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			
